



Garantire la corretta programmazione
e la rigorosa gestione
delle risorse pubbliche

PNC

Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR

Report n. 6 adempimenti e attività al 31 dicembre 2022

2020
2021
2022
2023



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR

Report n. 6: adempimenti e attività al 31 dicembre 2022

INDICE

CAPITOLO 1 - Quadro introduttivo	3
CAPITOLO 2 - Dettaglio sullo stato degli obiettivi posticipati nel terzo trimestre 2022 e degli obiettivi del IV trimestre 2022	5
CAPITOLO 3 - L'avanzamento complessivo del Piano.....	7
CAPITOLO 4 - Ripartizione territoriale delle risorse aggiornata al 31 dicembre 2022.....	8
CAPITOLO 5 - Il Fondo opere indifferibili per il PNC.....	10
Allegato 1	11
Programmi e interventi del PNC.....	11
A.4 - Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati.....	11
B.1 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016.....	11
B.1.1 - Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi	11
B.1.2 - Rilancio economico e sociale	12
C.1 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus	13
C.2 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi.....	13
C.2.1 - Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito:.....	13
<i>C.2.1.1 - Upgrading nuove navi.....</i>	<i>14</i>
<i>C.2.1.2 - Retrofit Navi</i>	<i>14</i>
C.2.2 - Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni:.....	14
<i>C.2.2.1 - Acquisto navi.....</i>	<i>15</i>
<i>C.2.2.2 - Ibridizzazione navi (Nave Iginia, Nave Messina, Acquisto nuova nave)</i>	<i>15</i>
C.2.3 - Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia:	15
<i>C.2.3.1 - Microliquefattori (130 mln)</i>	<i>15</i>
<i>C.2.3.2 - Navi bunkerine (90 mln).....</i>	<i>15</i>
C.3 - Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali	16
C.4 - Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci:.....	16
C.4.1 - Locomotori, carri e Raccordi ferroviari:	17
<i>C.4.1.1 - Locomotori e carri.....</i>	<i>17</i>
<i>C.4.1.2 - Raccordi ferroviari.....</i>	<i>17</i>
C.4.2 - Mezzi intermodali:.....	18
<i>C.4.2.1 - Locotrattori, transtainer, gru</i>	<i>18</i>
C.5 - Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25):	18
C.5.1 - Ponti e viadotti.....	19
C.5.2 - Smart Road.....	19
C.5.3 - Traforo del Gran Sasso	19

C.6 - Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale.....	19
C.7 - Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici.....	20
C.8 - Aumento selettivo della capacità portuale.....	20
C.9 - Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale.....	20
C.10 - Efficientamento energetico.....	21
C.11 - Elettrificazione delle banchine (Cold ironing).....	21
C.12 - Strategia Nazionale Aree Interne.....	21
C.13 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica.....	22
D.1 - Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali.....	23
E.1 - Salute, ambiente, biodiversità e clima:.....	23
E.1.1 – Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata.....	24
E.1.2 - Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale.....	24
E.1.3 - Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima.....	24
E.1.4 - Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima.....	25
E.1.5 - Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS.....	25
E.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile.....	25
E.3 - Ecosistema innovativo della salute.....	26
F.1 - "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale.....	26
F.3 - Accordi per l'Innovazione.....	27
G.1 - Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori	28
G.1.1 - Miglioramento degli spazi e della qualità della vita carceraria nelle carceri per adulti (DAP), attraverso la costruzione di 8 nuovi padiglioni "modello" per detenuti adulti.....	28
G.1.2 - Adeguamento strutturale, aumento dell'efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni.....	28
H.1 - Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo.....	29
I.1 - Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale..	29

CAPITOLO 1 - Quadro introduttivo

Il presente report riporta lo stato di avanzamento degli obiettivi e degli adempimenti relativi al **quarto trimestre 2022** per l'attuazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui al decreto-legge n. 59 del 2021, come individuati nell'Allegato 1 al decreto MEF del 15 luglio 2021.

Il report dà anche conto dello stato di avanzamento dei 16 obiettivi posticipati nel **terzo trimestre 2022** (alla luce dello slittamento di un trimestre previsto dal DM MEF 1° agosto 2022. Si veda in proposito report n. 5) e contiene, infine, un riepilogo complessivo delle scadenze relative all'intero anno 2022.

Come per i precedenti report, l'aggiornamento è stato predisposto sulla base dei dati ricavabili dai sistemi di monitoraggio RGS (BDAP-MOP) e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni titolari degli investimenti.

In via generale si evidenzia, rispetto alla situazione registrata nei trimestri precedenti, un maggiore ritardo nel rispetto delle scadenze, in particolare per quelle relative all'ultimo trimestre.

Si ritiene che tali ritardi siano in parte connessi al perdurare del **contesto di crisi economica e internazionale** che ha determinato difficoltà spesso oggettive nello svolgimento delle procedure di affidamento, anche a causa degli incrementi dei prezzi dei materiali. In tale ottica il capitolo 5 riporta un riepilogo delle risorse e degli interventi destinatari, nel 2022, delle assegnazioni disposte a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, istituito dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 allo scopo di consentire l'avvio delle gare per nuove opere e fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi.

Inoltre, i ritardi nel rispetto delle tempistiche sono in parte riconducibili all'assenza per alcuni programmi di nuovi **referenti unici** (da individuare ai sensi dell'art. 4 del DM MEF 15 luglio 2021) riconducibile anche a modifiche organizzative di molti Ministeri.

Infine, in alcuni casi i ritardi sono connessi alle procedure di verifica degli uffici della **Commissione europea** in tema di compatibilità con la disciplina sulla tutela della concorrenza. Come già segnalato nel report n. 4, ciò ha reso incerta l'attuazione di alcuni adempimenti, che le Amministrazioni responsabili hanno spesso ritenuto di non poter porre in essere in attesa del provvedimento unionale. In alcuni casi il riscontro è pervenuto, rendendo quindi possibile procedere, anche se in ritardo. In altri, invece, si è ancora in attesa del riscontro definitivo, per cui le procedure per l'attuazione sono di fatto sospese. Di seguito un riepilogo sulla base delle informazioni disponibili:


Codice univoco investimento / intervento	Programma/ investimento/ intervento	Stato autorizzazione UE	Data
PNC-C.2.1.1	Upgrading nuove navi	Pervenuta	novembre-22
PNC-C.2.1.2	Retrofit Navi	Pervenuta	novembre-22
PNC-C.2.3.1	Microliquefattori	Pervenuta	maggio-22
PNC-C.2.3.2	Navi bunkerine	Pervenuta	maggio-22
PNC-C.4.1.1	Locomotori e carri	Non pervenuta	
PNC-C.4.1.2	Raccordi ferroviari	Non pervenuta	
PNC-C.4.2.1	Locotrattori, transtainer/gru	Pervenuta	giugno-22
PNC-F.1	Polis	Pervenuta	ottobre-22
PNC-H.1	Contratti di filiera	Pervenuta	dicembre-22

Va segnalato, infine, che sono pervenute da diverse Amministrazioni istanze per la proroga dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale, stante la difficoltà di rispettare le scadenze anche alla luce delle problematiche sopra descritte. Su tale profilo è in corso di valutazione una eventuale revisione delle scadenze che mantenga comunque come punti fermi e inderogabili il rispetto del cronoprogramma finanziario e dell'impegno assunto nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa delle risorse del PNC (M1C1-62).

CAPITOLO 2 - Dettaglio sullo stato degli obiettivi posticipati nel terzo trimestre 2022 e degli obiettivi del IV trimestre 2022


Come rappresentato nel report n. 5, gli obiettivi del terzo trimestre risultavano sostanzialmente tutti posticipati ad eccezione di 3 obiettivi conseguiti.¹

Figura 1. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021, dei dati presenti in BDAP e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni.

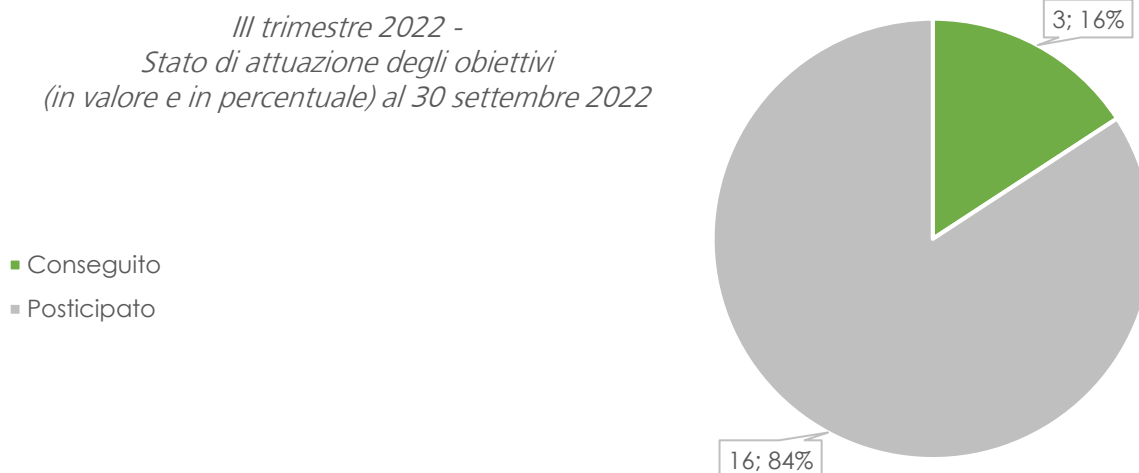

Nonostante il posticipo della scadenza, solo altri 5 obiettivi sono stati conseguiti, come emerge dalla rappresentazione seguente.


Figura 2. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021, dei dati presenti in BDAP e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni.

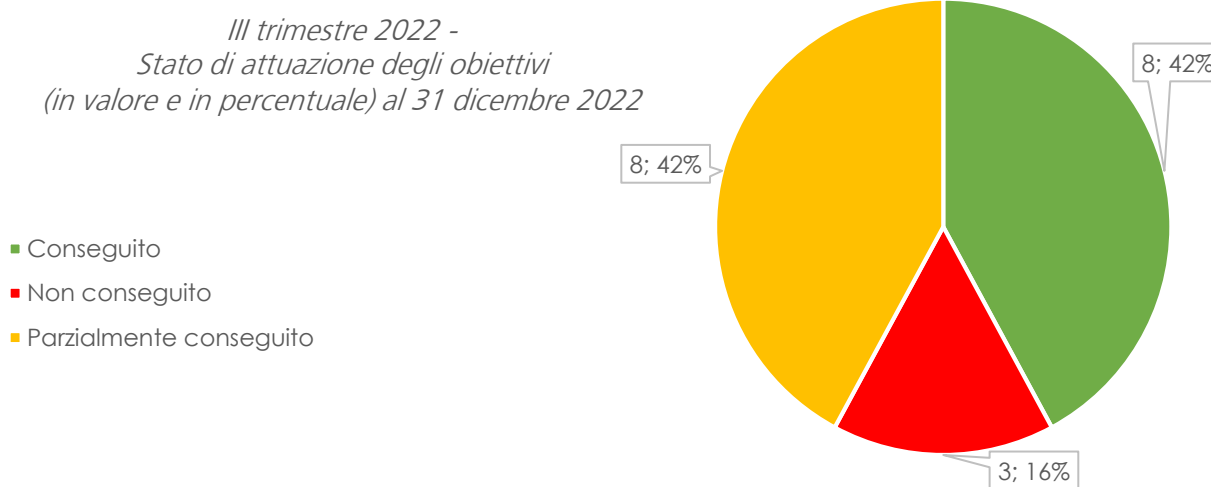

¹ Per il dettaglio si rinvia al report n. 5 disponibile al seguente link https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-Attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/Documenti/PNC_report-5-30-settembre-2022.pdf

Alla scadenza del 31 dicembre 2022 (T4 2022), il DM MEF 15 luglio 2021 prevede 24 obiettivi ripartiti tra le diverse Amministrazioni come rappresentato nella figura 3.

Figura 3. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021.

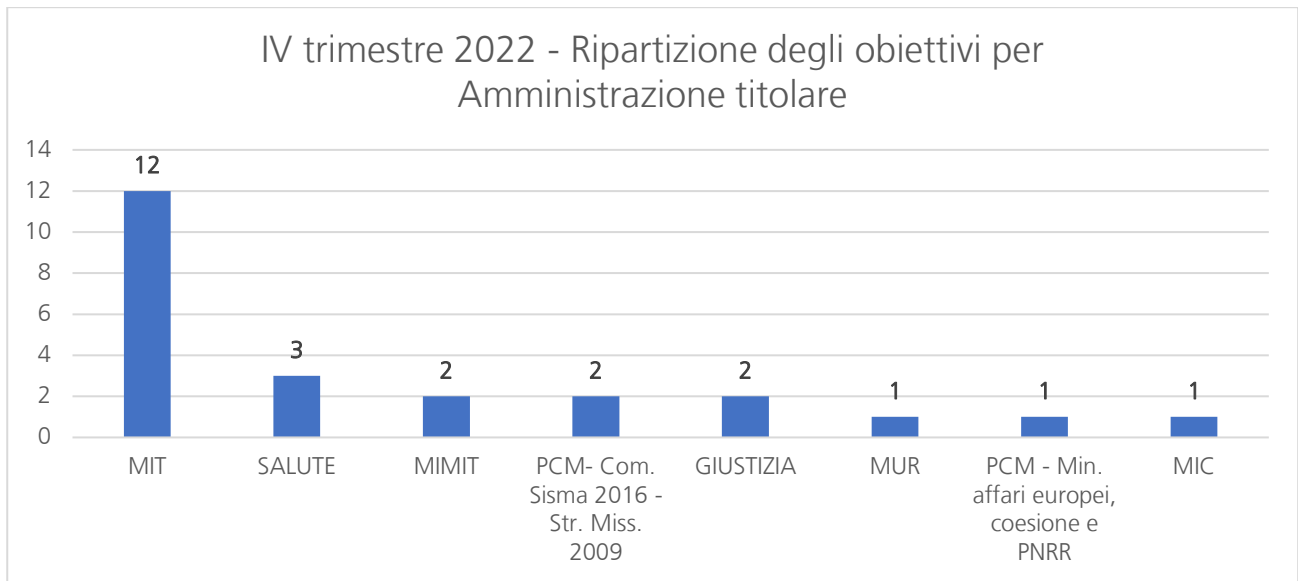


Il 25% degli obiettivi del IV trimestre 2022 risulta non conseguito. Di seguito la rappresentazione grafica.

Figura 4. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021, dei dati presenti in BDAP e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni.

IV trimestre 2022 - Stato di attuazione degli obiettivi (in valore e in percentuale)


- Conseguito
- Non conseguito
- Parzialmente conseguito

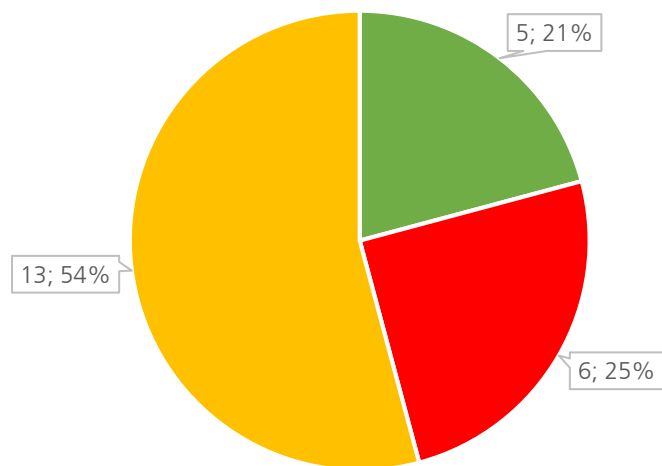

CAPITOLO 3 - L'avanzamento complessivo del Piano

La tabella seguente illustra l'avanzamento complessivo dei programmi del Piano dando evidenza anche dei ritardi sugli obiettivi dei trimestri precedenti che non risultano ancora recuperati.

Tabella 1. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021, dei dati presenti in BDAP e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni.

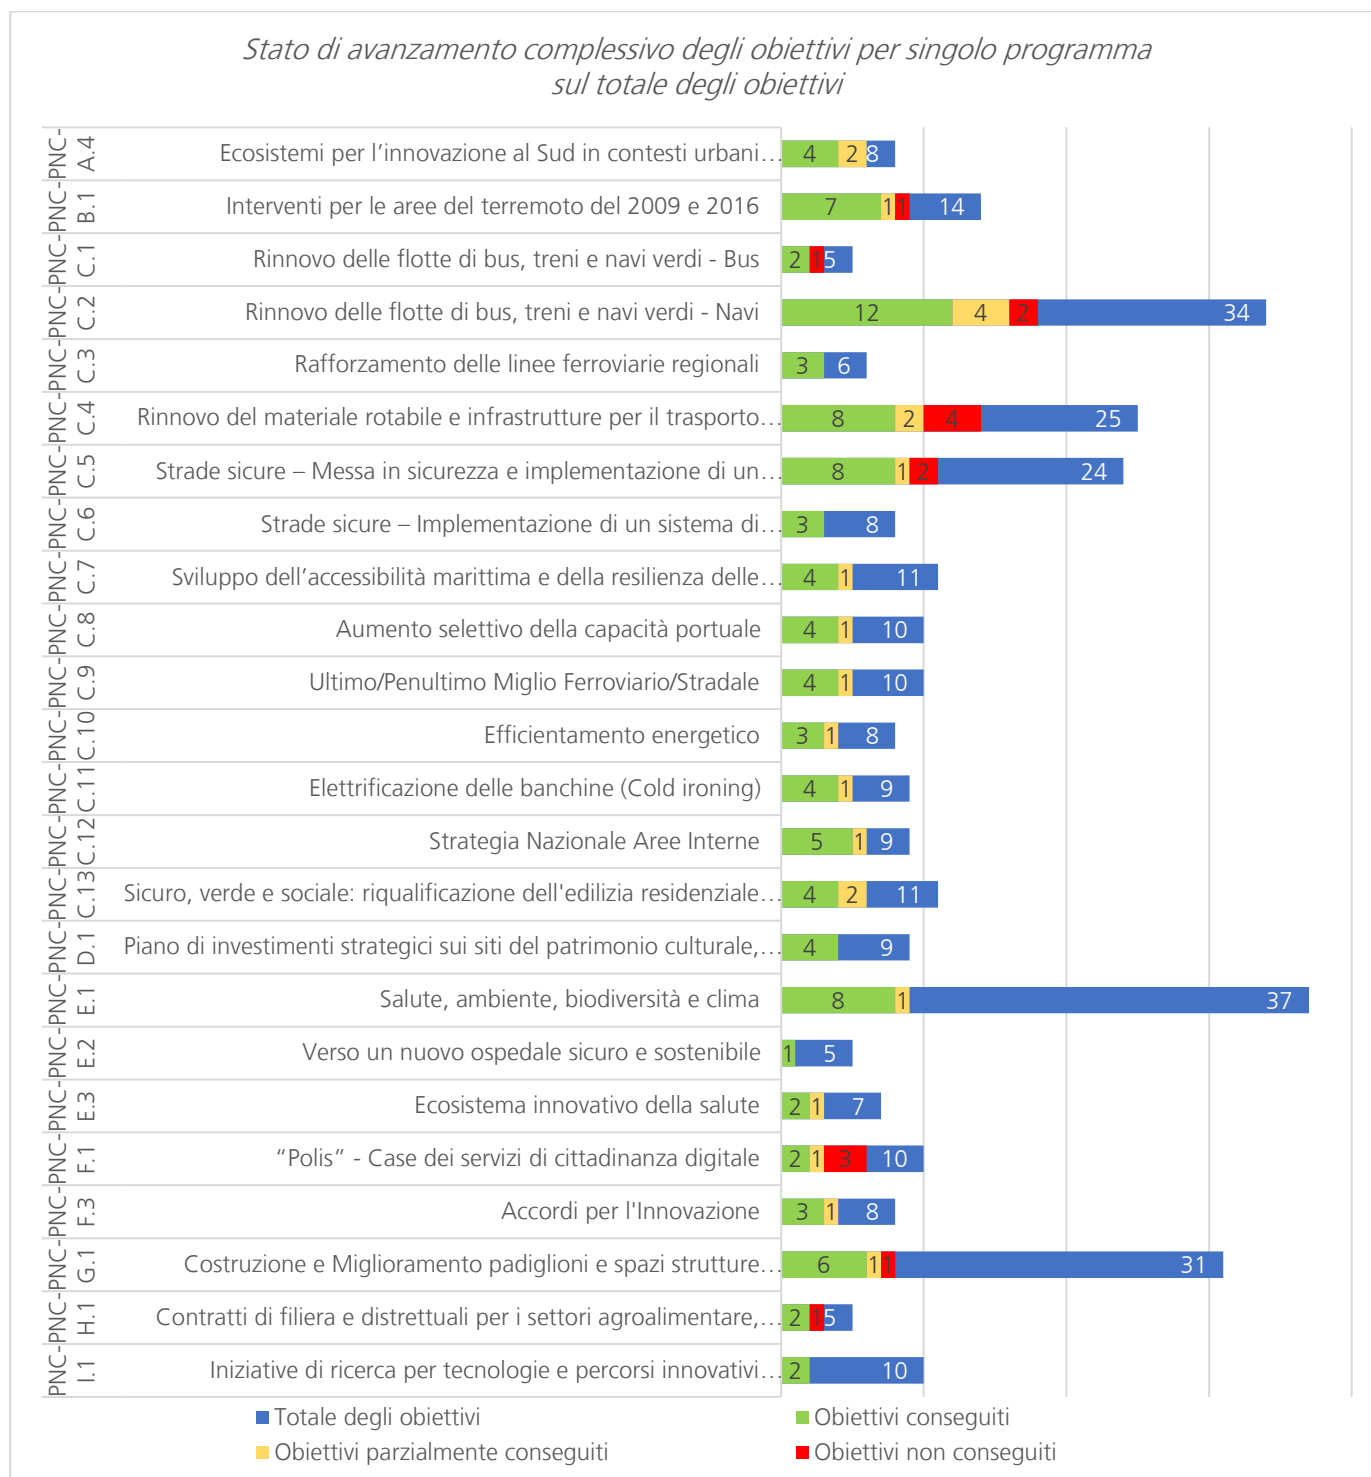

CAPITOLO 4 - Ripartizione territoriale delle risorse aggiornata al 31 dicembre 2022

Si riporta di seguito un aggiornamento della distribuzione regionale delle risorse relative ai programmi indicati nel DM MEF del 15 luglio 2021 (circa 19,37 miliardi di euro) sulla base dei dati presenti nel sistema di monitoraggio. Rispetto a quanto indicato nel report di inizio 2022, risultano ripartite risorse per circa 15,02 miliardi di euro (inclusi gli interventi localizzati su più Regioni), al netto di circa 4,35 miliardi di euro il cui iter di ripartizione non è ancora concluso o che per loro destinazione non sono ex ante territorialmente ripartibili.

Rappresentazione grafica della ripartizione a livello regionale delle risorse dei programmi di cui al DM MEF del 15 luglio 2021 in mld/€



Regioni	Importo (in mld di euro)
Abruzzo	0,55
Basilicata	0,15
Calabria	0,56
Campania	1,68
Emilia-Romagna	0,49
Friuli-Venezia giulia	0,57
Lazio	2,45
Liguria	0,78
Lombardia	0,80
Marche	0,49
Molise	0,10
Piemonte	0,40
Puglia	0,86
Sardegna	0,51
Sicilia	1,24
Toscana	0,45
Trentino-Alto Adige	0,08
Umbria	0,38
Valle d'Aosta	0,02
Veneto	0,68
Totale risorse ripartite tra le Regioni	13,24
% risorse ripartite localizzate al SUD	42,6%
Interventi localizzati su più Regioni	1,78
Altri interventi da ripartire/non ripartibili	4,35
Totale DM MEF 15 luglio 2021	19,37

CAPITOLO 5 - Il Fondo opere indifferibili per il PNC

Per fronteggiare l'eccezionale aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, che ha reso difficoltoso l'avvio delle gare per nuove opere, il c.d. D.L. Aiuti – D.L. 17 maggio 2022 n. 50, ha previsto un meccanismo di adeguamento delle basi di asta.

Nello specifico, l'articolo 26, comma 7, del predetto decreto-legge ha istituito il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, finalizzato a consentire l'avvio entro il 31/12/2022 delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi, con uno stanziamento di complessivi 8,4 mld di euro dal 2022 al 2027, di cui 900 mln specificatamente destinati al PNC.

Il fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e la procedura è gestita dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante i propri sistemi informativi

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022, pubblicato nella GU n. 213 del 12 settembre 2022, sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo. Le risorse sono state assegnate alle stazioni appaltanti con il decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 18 novembre 2022.

Agli interventi del PNC sono stati assegnati **453.759.907,93 euro** a cui si aggiungono **314.720.128,16 euro** preassegnati agli enti locali per interventi rientranti nei 4 programmi B1, C12, C13 e D1, per un totale di **768.480.036,09 euro**.

Con il decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 193 del 2022, concernente l'attuazione dell'articolo 10 comma 2 del D.L. n. 176 del 18 novembre 2022 (c.d. procedura di recupero), è stata disciplinato l'accesso, da parte delle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC, in possesso dei requisiti previsti dalla norma (in particolare che abbiano pubblicato il bando per l'affidamento entro il 31 dicembre 2022), alle risorse residue disponibili del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. La procedura è in corso e si prevede di adottare il provvedimento di assegnazione delle risorse nel mese di febbraio 2023.

Da ultimo, con la legge di bilancio per il 2023, articolo 1, commi 369 e ss., il Fondo è stato rifinanziato per complessivi 10 miliardi di euro, dal 2023 al 2027, destinati anche agli interventi del PNC. Sono attualmente in corso di attuazione le procedure di assegnazione agli enti locali (cosiddetta preassegnazione).

Di seguito un riepilogo delle risorse relative alla procedura 2022 assegnate ai programmi PNC.

PROGRAMMA PNC	Procedura semplificata (preassegnazione)		Procedura ordinaria	
	n. interventi	euro	n. interventi	euro
B.1	732	74.086.351,57	40	93.526.903,44
C.3			5	70.433.230,17
C.7			4	63.447.195,35
C.9			1	4.137.000,00
C.11			3	2.416.266,18
C.12	714	42.306.579,77		
C.13	425	94.078.096,82	202	122.403.203,45
D.1	49	104.249.100,00		
E.1			1	442.580,80
E.2			61	83.113.528,54
G.1			4	13.840.000,00
TOTALE	1920	314.720.128,16 €	321	453.759.907,93

Allegato 1

Programmi e interventi del PNC

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
A.4 - Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati	PCM: Min. affari europei, coesione e PNRR	350,00	III trimestre 2022 (posticipato ex DM MEF 1° agosto 2022) Pubblicazione di tutti i bandi di gara e aggiudicazione per almeno 2 HUB.	Parzialmente conseguito. L'obiettivo posticipato del III/2022 risulta parzialmente conseguito in quanto, pur non essendo stati pubblicati tutti i bandi di gara, per due interventi risulta intervenuta l'aggiudicazione della relativa gara.	II/2023 Avvio dei lavori in tutti gli HUB
			IV trimestre 2022 Aggiudicazione per tutti gli HUB - Avvio dei lavori in almeno 2 HUB.	Parzialmente conseguito. Sulla base dei dati presenti nel sistema di monitoraggio, su 27 interventi individuati da CUP risultano aggiudicate gare per 14 interventi, e non risultano lavori avviati.	
B.1 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016					
B.1.1 - Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi	PCM: Commissario	1.080,00	III trimestre 2022 (posticipato ex DM MEF 1° agosto 2022)	Conseguito. L'obiettivo posticipato del III/2022 risulta	IV/2023 25% dei SAL

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
	sisma 2016 Dip. "Casa Italia" Struttura di missione sisma 2009.		Pubblicazione, da parte delle stazioni appaltanti, dei bandi di gara.	sostanzialmente conseguito in quanto per quasi tutti i CUP (818 interventi) risultano CIG. Si segnalano minimi disallineamenti tra il dato fornito dall'Amministrazione titolare (1 CUP privo di CIG) e quanto emerge dal sistema di monitoraggio (23 CUP privi di CIG). È in corso di verifica il disallineamento tra i dati. Come segnalato in premessa, n. 732 interventi su 818 hanno beneficiato della preassegnazione a valere sul Fondo opere indifferibili. Sui bandi pubblicati sono ancora in corso le verifiche, che hanno subito ritardi a causa di problemi tecnici con i sistemi ANAC.	
			IV trimestre 2022 Aggiudicazione e avvio dei lavori.	Parzialmente conseguito. Su 818 interventi con CUP: <ul style="list-style-type: none"> - per circa il 95% risulta raggiunto l'obiettivo dell'aggiudicazione; - per circa il 50% non risulta ancora stipulato il contratto e quindi non sono stati avviati i lavori. 	
B.1.2 - Rilancio economico e sociale		700,00	IV trimestre 2022 Approvazione da parte dei	Non conseguito. Sono in corso le istruttorie dei	IV/2023 relazione da parte dei

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
			soggetti attuatori delle istanze presentate e concessione dei finanziamenti.	progetti di investimento presentati dalle imprese (allo stato l'avanzamento delle istruttorie ha superato il 50%) con l'obiettivo di procedere quanto prima alla relativa concessione.	soggetti attuatori che attestino l'utilizzo di almeno il 25% del valore finanziario dei progetti/iniziative
C.1 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus	MIT	600,00	III trimestre 2022 (posticipato ex DM MEF 1° agosto 2022) Sottoscrizione dei contratti.	Non conseguito. L'obiettivo posticipato del III/2022 risulta non conseguito. Su 38 interventi associati ad altrettanti CUP solo per 5 CUP (di cui 2 segnalati dall'Amministrazione e non ancora rilevati nel sistema di monitoraggio) risultano contratti firmati. In merito alla completezza dei dati, l'Amministrazione titolare ha sollecitato i beneficiari ad una corretta implementazione della banca dati.	IV/2024 50% di autobus acquistati
			IV trimestre 2022 Nessun adempimento.		
C.2 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi					
C.2.1 - Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità					

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
navali a combustibile pulito:					
C.2.1.1 - <i>Upgrading nuove navi</i> C.2.1.2 - <i>Retrofit Navi</i>	MIT	500,00	III trimestre 2022 (posticipato ex DM MEF 1° agosto 2022) Individuazione beneficiari e accordi procedurali con beneficiari.	Parzialmente conseguito. Con decreto direttoriale MIT n. 318 del 29 dicembre 2022 sono stati individuati i beneficiari delle misure. Non risultano ancora sottoscritti gli accordi con i beneficiari. Si aggiunge che la Corte dei conti, con nota del 24 gennaio 2023 ha ritenuto, sulla base degli elementi disponibili, raggiunti gli obiettivi fissati rappresentando al contempo che è stato utilizzato solo il 32% delle risorse disponibili (circa 163,4 mln su 500 mln complessivi). In merito alla completezza dei dati è necessario acquisire i CUP al fine di permettere il monitoraggio sull'avanzamento della misura.	II/2023 Sottoscrizione contratti
			IV Trimestre 2022 Nessun adempimento.		
C.2.2 - Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni:					

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
C.2.2.1 - Acquisto navi	MIT	60,00	III trimestre 2022 (posticipato ex DM MEF 1° agosto 2022) e precedenti Obiettivo del III/2022 posticipato: Avvio dei lavori di progettazione. Obiettivo del II/2022 in ritardo: Aggiudicazione gara per acquisto delle 3 nuove unità navali veloci.	Non conseguito. In merito ai trimestri precedenti, gli obiettivi non risultano conseguiti . I lavori non di progettazione non risultano avviati e la gara risulta non ancora aggiudicata. L'Amministrazione ha comunicato che si ritiene di poter aggiudicare nel mese di febbraio 2023.	II/2023 Consegna progettazione per le 3 nuove unità navali veloci
			IV trimestre 2022 Nessun adempimento.		
C.2.2.2 - Ibridizzazione navi (Nave Iginia, Nave Messina, Acquisto nuova nave)	MIT	20,00	IV trimestre 2022 Nessun adempimento.		IV/2024 Ibridizzazione nave traghetto Messina in esercizio
C.2.3 - Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia:					
C.2.3.1 - Microliquefattori (130 mln) C.2.3.2 - Navi bunkerine (90 mln)	MIT	220,00	III trimestre 2022 (posticipato ex DM MEF 1° agosto 2022) Individuazione beneficiari e accordi procedurali con beneficiari.	Parzialmente conseguito. Con decreto direttoriale MIT n. 319 del 30 dicembre 2022, (corretto con successivo decreto n. 3 del 4 gennaio 2023) sono stati individuati i beneficiari delle misure.	I/2023 Avvio dei lavori

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
				<p>Non risultano ancora sottoscritti gli accordi con i beneficiari.</p> <p>Si aggiunge che la Corte dei conti, con nota del 24 gennaio 2023 ha ritenuto, sulla base degli elementi disponibili, raggiunti gli obiettivi fissati, rappresentando al contempo che è stato utilizzato solo il 57% delle risorse disponibili (circa 126 mln sui 220 mln complessivi).</p> <p>In merito alla completezza dei dati è necessario acquisire i CUP al fine di permettere il monitoraggio sull'avanzamento della misura.</p>	
			<p>IV trimestre 2022</p> <p>Nessun adempimento.</p>		
C.3 - Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali	MIT	1.550,00	<p>IV trimestre 2022</p> <p>Pubblicazione bando del 100% dei lavori.</p> <p>Stipula contratti per il 38% dei lavori.</p> <p>Avvio del 38% dei lavori.</p>	<p>Conseguito.</p> <p>L'Amministrazione ha fornito dati a supporto del conseguimento degli obiettivi, tuttavia non completamente allineati a quelli ricavabili dal sistema di monitoraggio. Sono in corso di verifica i disallineamenti.</p>	<p>II/2023</p> <p>Stipula contratti per il 100% dei lavori. Avvio del 100% dei lavori</p>
C.4 - Rinnovo del materiale					

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci:					
C.4.1 - Locomotori, carri e Raccordi ferroviari:					
<i>C.4.1.1 - Locomotori e carri</i>	MIT	115,00	<p>III trimestre 2022 (posticipato ex DM MEF 1° agosto 2022) e precedenti</p> <p>Obiettivo del III/2022 posticipato: DM Assegnazione delle risorse per l'acquisto dei mezzi ai beneficiari.</p> <p>Obiettivo del II/2022 in ritardo: Individuazione beneficiari locomotori e carri.</p> <p>Obiettivo del I/2022 in ritardo: Avvio della procedura di concessione dei contributi.</p>	<p>Non conseguiti.</p> <p>La procedura è di fatto sospesa in attesa dell'autorizzazione da parte della Commissione europea in materia di aiuti di Stato. In assenza del riscontro della Commissione non è possibile perfezionare il decreto che disciplina le modalità di gestione della misura e quindi di consentire di presentare l'istanza di accesso al contributo.</p>	<p>IV/2023</p> <p>Consegna 50% carri dal costruttore al beneficiario</p>
		<p>IV trimestre 2022</p> <p>Avvio procedure di acquisto mezzi da parte dei beneficiari.</p>			
<i>C.4.1.2 - Raccordi ferroviari</i>	MIT	30,00	<p>II trimestre 2022</p> <p>Obiettivo del II/2022 in ritardo: Trasferimento risorse a RFI per elettrificare i</p>	<p>L'obiettivo del II/2022 non risulta ancora conseguito. La procedura è di fatto sospesa in attesa dell'autorizzazione della Commissione europea in</p>	<p>III/2023</p> <p>Conclusione primo step di lavori di elettrificazione raccordi alla rete RFI come</p>

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
			raccordi intermodali.	materia di aiuti di Stato sul decreto che definisce le modalità di assegnazione delle risorse per gli interventi di adeguamento dell'ultimo e penultimo miglio.	individuato nel relativo contratto di programma
			IV trimestre 2022 Nessun adempimento.		
C.4.2 - Mezzi intermodali:					
<i>C.4.2.1 - Locotrattori, transtainer, gru</i>	MIT	55,00	IV trimestre 2022 Avvio procedure di acquisto locotrattori, transtainer e gru da parte dei beneficiari.	Parzialmente conseguito. Il 31 ottobre 2022 è stata pubblicata la circolare attuativa con le indicazioni operative per la realizzazione e la verifica degli interventi ammessi a finanziamento. Non sono disponibili dati sull'avvio delle procedure di acquisto, ma l'Amministrazione ha comunicato che sono in corso le attività di riscontro delle comunicazioni dei beneficiari sullo stato di attuazione.	III/2023 Consegna locotrattori dal costruttore al beneficiario
C.5 - Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25):					

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
C.5.1 - Ponti e viadotti	MIT	770,00 di cui: - 130,00 per monitoraggio dinamico; - 640,00 per interventi di adeguamento di ponti e viadotti	III trimestre 2022 (posticipato ex DM MEF 1° agosto 2022) Avvio lavori di installazione dispositivi di monitoraggio. Redazione del progetto Interventi adeguamento 16 ponti e viadotti.	Parzialmente conseguito. L'obiettivo posticipato del III/2022 risulta parzialmente conseguito : sono stati avviati i lavori di installazione dei dispositivi di monitoraggio ed è stato pubblicato a dicembre 2022 il bando di gara per la progettazione e la realizzazione delle opere di messa in sicurezza di 16 viadotti (appalto integrato).	I/2023 + 20 ponti e viadotti monitorati a trimestre (80 nel 2023 e ulteriori 70 nel 2024)
			IV trimestre 2022 20 ponti e viadotti monitorati.	Non conseguito.	
C.5.2 - Smart Road	MIT	130,00	IV trimestre 2022 Nessun adempimento.		IV/2024 Attivazione dispositivi Smart road sulle prime tratte
C.5.3 - Traforo del Gran Sasso	MIT	100,00	IV trimestre 2022 Pubblicazione del bando di gara per l'esecuzione dei lavori di adeguamento ed efficientamento.	Non conseguito. Non risulta ancora pubblicato il bando di gara.	I/2023 Aggiudicazione del contratto
C.6 - Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria	MIT	450,00	IV trimestre 2022 Avvio procedura di affidamento dei lavori.	Conseguito. Su 60 interventi individuati da CUP, risulta avviata la procedura di affidamento per oltre il 90% degli stessi.	I/2023 Aggiudicazione dei lavori

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
principale				Pertanto, è possibile ritenere l'obiettivo sostanzialmente conseguito .	
C.7 - Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici	MIT	1.470,00	IV trimestre 2022 Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 30% delle opere/esecuzione dei lavori da parte delle Autorità di sistema portuale e Avvio del 30% dei lavori.	Parzialmente conseguito. Risultano aggiudicati bandi di gara per il 31% dei progetti (circa il 42% in termini di risorse sul totale). Non risultano dati sul raggiungimento della percentuale prevista in termini di avvio lavori.	II/2023 Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori
C.8 - Aumento selettivo della capacità portuale	MIT	390,00	II trimestre 2022 Pubblicazione dei bandi di gara per la realizzazione del 30% delle opere /esecuzione dei lavori.	Il ritardo del II/2022 risulta recuperato , in quanto sono stati pubblicati bandi di gara per il 29% dei progetti.	II/2023 Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori
			IV trimestre 2022 Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 30% delle opere/esecuzione dei lavori da parte delle Autorità di sistema portuale e Avvio del 30% dei lavori.	Parzialmente conseguito. Risultano aggiudicati bandi di gara per il 29% dei progetti (8% in termini di risorse sul totale). Non risultano dati sul raggiungimento della percentuale prevista in termini di avvio lavori.	
C.9 - Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale	MIT	250,00	IV trimestre 2022 Aggiudicazione del contratto per la	Parzialmente conseguito. Risultano aggiudicati bandi di gara per il 14% dei progetti	II/2023 Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
			realizzazione del 30% delle opere/esecuzione dei lavori da parte delle Autorità di sistema portuale e Avvio del 30% dei lavori.	(4% in termini di risorse sul totale). Non risultano dati sul raggiungimento della percentuale prevista in termini di avvio lavori.	dei bandi di gara per la realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori
C.10 - Efficientamento energetico	MIT	50,00	II trimestre 2022 Pubblicazione dei bandi di gara per la realizzazione dell'opera/esecuzione dei lavori.	Il ritardo sul II/2022 non è stato recuperato in quanto non risultano pubblicati bandi per lavori per il 100% dei progetti.	I/2023 Aggiudicazione del contratto per la realizzazione dell'opera/esecuzione dei lavori
			IV trimestre 2022 Nessun adempimento.		
C.11 - Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)	MIT	700,00	II trimestre 2022 Pubblicazione dei bandi di gara per la realizzazione del 30% delle opere /esecuzione dei lavori.	Il ritardo sul II/2022 è stato sostanzialmente recuperato in quanto risultano pubblicati bandi di gara per circa il 25% del totale.	III/2023 Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori
			IV trimestre 2022 Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 30% delle opere/esecuzione dei lavori da parte delle Autorità di sistema portuale e Avvio del 30% dei lavori.		
C.12 - Strategia Nazionale Aree	MIT	300,00	III trimestre 2022	Conseguito.	I/2023

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
Interne			(posticipato ex DM MEF 1° agosto 2022) Predisposizione dei progetti da parte dei S.A.	Sono stati predisposti e approvati i progetti.	Aggiudicazione dei contratti
			IV trimestre 2022 Pubblicazione dei bandi di gara per la realizzazione degli interventi.	Parzialmente conseguito. Su un totale di 747 interventi individuati da CUP (di cui 744 in stato attivo) risultano pubblicati bandi di gara per 172 interventi. Come segnalato in premessa, n. 714 interventi hanno beneficiato della preassegnazione a valere sul Fondo opere indifferibili. Sui bandi pubblicati sono ancora in corso le verifiche, che hanno subito ritardi a causa di problemi tecnici con i sistemi ANAC.	
C.13 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica	MIT	2.000,00	III trimestre 2022 (posticipato ex DM MEF 1° agosto 2022) Approvazione della progettazione finale ed esecutiva da parte delle stazioni appaltanti.	Parzialmente conseguito. Si rinvia a quanto segnalato in relazione all'obiettivo relativo al IV trimestre. Si rileva altresì un disallineamento con i dati presenti nel sistema di monitoraggio.	I/2023 Aggiudicazione dei contratti da parte delle stazioni appaltanti
			IV trimestre 2022 Pubblicazione da parte delle	Parzialmente conseguito. Su 988 interventi identificati	

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
			stazioni appaltanti dei bandi di gara per la realizzazione dell'opera/esecuzione dei lavori.	da CUP risultano pubblicati bandi per l'esecuzione dei lavori per 777 interventi. Come segnalato in premessa, n. 425 interventi hanno beneficiato della preassegnazione a valere sul Fondo opere indifferibili. Sui bandi pubblicati sono ancora in corso le verifiche, che hanno subito ritardi a causa di problemi tecnici con i sistemi ANAC.	
D.1 - Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali	MIC	1.455,24	IV trimestre 2022 Aggiudicazione delle gare per interventi corrispondenti al 30% delle risorse.	Conseguito. La percentuale delle gare pubblicate ha raggiunto il 57% delle risorse. In merito alle aggiudicazioni, la percentuale sul totale delle risorse è pari al 47%. Come segnalato in premessa, n. 49 interventi hanno beneficiato della preassegnazione a valere sul Fondo opere indifferibili. Sui bandi pubblicati sono ancora in corso le verifiche, che hanno subito ritardi a causa di problemi tecnici con i sistemi ANAC.	I/2023 Decreto di assegnazione definitiva delle risorse (sulla base di QE definitivo pre-gara) a seguito del perfezionamento dei livelli progettuali. Avvio lavori per interventi corrispondenti al 30% delle risorse.
E.1 - Salute, ambiente, biodiversità e clima:					

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
E.1.1 – Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata	SALUTE	415,38	III trimestre 2022 (posticipato ex DM MEF 1° agosto 2022) Avvio interventi per il 5% del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPA).	Conseguito L'Amministrazione ha fornito elementi a supporto del conseguimento dell'obiettivo, non ancora allineati tuttavia a quelli ricavabili dal sistema di monitoraggio. Sono in corso di verifica i disallineamenti.	I/2023 Pubblicazione bando, aggiudicazione (entro 3 mesi successivi) e avvio interventi (entro 3 mesi successivi): per 5% del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPS-SNPA) e 25% del rafforzamento complessivo delle strutture nazionali.
			IV trimestre 2022 Nessun adempimento.		
E.1.2 - Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale	SALUTE	49,50	IV trimestre 2022 Provvedimenti per l'identificazione dei siti contaminati e definizione del piano di interventi integrati di promozione della salute, sorveglianza attiva e assistenza sanitaria e sistemi di comunicazione partecipativa delle comunità.	Conseguito. Il 18 novembre 2022 è stato costituito il gruppo di lavoro, che ha individuato i requisiti minimi dei siti di interesse nazionale. E' stato adottato in data 10 gennaio 2023 il decreto direttoriale di approvazione dei suddetti requisiti.	IV/2023 Pubblicazione bando e aggiudicazione.
E.1.3 - Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima	SALUTE	6,12	IV trimestre 2022 Nessun adempimento.		IV/2023 Fase esecutiva - Acquisizione e rinnovamento infrastrutturale, di strumentazioni gestionali, piattaforme informatiche e sistemi qualità presso il centro di formazione Salute, Ambiente e Clima presso

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
					l'ISS
E.1.4 - Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima	SALUTE	21,00	III trimestre 2022 (posticipato ex DM MEF 1° agosto 2022) Aggiudicazione.	Conseguito. Con decreto direttoriale del 30 settembre 2022 sono stati ammessi a finanziamento 13 progetti e stipulati i relativi accordi di collaborazione tra Ministero della salute e regioni/PPAA aggiudicatarie. Non essendo state impiegate tutte le risorse, a seguito della pubblicazione, in data 18 ottobre 2022, di un nuovo bando sono stati valutati positivamente due ulteriori progetti di ricerca applicata e sono in corso gli adempimenti per la sottoscrizione degli accordi.	IV/2026 Almeno 14 programmi attivati di promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima.
			IV trimestre 2022 Avvio interventi.	Parzialmente conseguito. Per 10 progetti è stato comunicato l'avvio delle attività.	
E.1.5 - Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS	SALUTE	8,00	IV trimestre 2022 Nessun adempimento.		II/2023 Provvedimento di adozione Piano di Digitalizzazione della rete SNPS e SNPA
E.2 - Verso un ospedale sicuro e	SALUTE	1.450,00	IV trimestre 2022		I/2023

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
sostenibile			Nessun adempimento.		Pubblicazione di gare d'appalto o accordo quadro per interventi antisismici da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del Ssn
E.3 - Ecosistema innovativo della salute	SALUTE	437,40	IV trimestre 2022 Aggiudicazione e stipula atti formali con i soggetti attuatori ed impegno/erogazione 1° quota di finanziamento ai soggetti attuatori pari al 20% dei fondi totali disponibili.	Parzialmente conseguito Le convenzioni sono state firmate dalle parti entro il 31 dicembre 2022 e inviate agli organi di controllo. Non è stata ancora erogata la quota di finanziamento prevista.	IV/2023 monitoraggio stato di attuazione previsto negli atti formali (convenzioni e/o accordi), rendicontazione, verifica dello stato di avanzamento del progetto - pagamento 2° quota di finanziamento ai soggetti attuatori pari al 20% dei fondi totali disponibili per l'intero programma salvo residui anno precedente
F.1 - "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale	MIMIT	800,00	III trimestre 2022 (posticipato ex DM MEF 1° agosto 2022) e precedenti Obiettivo del III/2022 posticipato: Realizzazione interventi pilota. Obiettivo del II/2022 in ritardo: Aggiudicazione gare d'appalto. Obiettivo del I/2022 in ritardo: Pubblicazione dei bandi di gara.	Parzialmente conseguito. L'obiettivo del III/2022 posticipato risulta parzialmente conseguito . I progetti pilota avviati dal soggetto attuatore sono in corso di realizzazione. Risultano tuttavia non ancora recuperati i ritardi sugli obiettivi dei trimestri precedenti. Allo stato, come riportato nella nota MIMIT del 16/12/2022, sono state	II/2023 Completamento ed attivazione piattaforma multicanale

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
				avviate (gare pubblicate) 19 procedure su 21 pianificate per un importo complessivo pari a 461 milioni di euro. Risultano effettuate 115 assegnazioni (aggiudicazioni) (per un valore complessivo a base di gara di circa 260 milioni di euro) su 144 poste a gara.	
			IV trimestre 2022 Avvio sviluppo piattaforma multicanale per erogazione servizi PA; Avvio lavori di trasformazione Uffici Postali (UP) per implementazione HUB PA; Avvio lavori per realizzazione spazi di coworking ed attività educative.	Non conseguito. In ordine all'avvio dello sviluppo della piattaforma multicanale per erogazione servizi PA, il MIMIT sta tenendo riunioni tecniche con le altre Amministrazioni interessate.	
F.3 - Accordi per l'Innovazione	MIMIT	1.000,00	IV trimestre 2022 Emanazione decreti di concessione delle agevolazioni per ammontare pari ad almeno il 30% delle risorse stanziare per la misura.	Parzialmente conseguito. La Direzione competente del MIMIT ha comunicato di aver sottoscritto, al 31 dicembre 2022, 58 accordi, per un ammontare complessivo di agevolazioni, a valere sul PNC, di circa 284 milioni di euro. Alla stessa data, sono stati trasmessi agli organi di controllo 31 dei 58 accordi. A seguito della registrazione si potrà procedere	II/2023 Emanazione decreti di concessione delle agevolazioni per ammontare pari al 100% delle risorse stanziare per la misura.

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
				all'emanazione dei decreti di concessione delle agevolazioni.	
G.1 - Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori					
G.1.1 - Miglioramento degli spazi e della qualità della vita carceraria nelle carceri per adulti (DAP), attraverso la costruzione di 8 nuovi padiglioni "modello" per detenuti adulti	GIUSTIZIA	84,00	IV trimestre 2022 50% approvazione del livello di progettazione da porre a base di gara.	Parzialmente conseguito. Per 3 interventi su 8 è stato approvato il PFTE e pubblicato il bando per progettazione esecutiva e lavori ovvero avviata la procedura per appalto integrato. Per altri 4 interventi si prevede l'approvazione della progettazione da porre a base di gara entro il primo trimestre 2023.	I/2023 - 50% pubblicazione bandi di gara per l'affidamento dei lavori; - 100% approvazione del livello di progettazione da porre a base di gara
G.1.2 - Adeguamento strutturale, aumento dell'efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni	GIUSTIZIA	48,90	III trimestre 2022 (posticipato ex DM MEF 1° agosto 2022) 100% aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria/architettura.	Conseguito. Aggiudicati i servizi di ingegneria/architettura per tre interventi su quattro. Per l'intervento di Roma-Casal del Marmo è stata pubblicata e aggiudicata la gara per appalto integrato.	I/2023 - 75% pubblicazione bandi di gara per l'affidamento dei lavori; - 100% approvazione del livello di progettazione da porre a base di gara
			IV trimestre 2022 75% approvazione del livello di progettazione da	Non conseguito. Solo 1 intervento è in linea	

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
			porre a base di gara.	con l'obiettivo.	
H.1 - Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	MASAF	1.203,30	I trimestre 2022 Pubblicazione bandi altri settori.	Il ritardo sul I/2022 non risulta recuperato per i contratti di distretto settore per il settore forestale (10 mln), non essendo stato pubblicato il relativo bando.	I/2023 Approvazione delle graduatorie finali per la concessione degli aiuti finanziari settore agroalimentare
			IV trimestre 2022 Nessun adempimento.		
I.1 - Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale	MUR	500,00	IV trimestre 2022 Decreto di ammissione al finanziamento dei progetti selezionati e avvio dei progetti per la prima finestra del primo bando.	Conseguito. In data 9 dicembre 2022 sono stati adottati i decreti di ammissione al finanziamento per le quattro iniziative selezionate: <ul style="list-style-type: none"> - Hub1 - fond digital driven diagnostics, prognostic and therapeutics for sustainable health care - Hub2 - dare - digital lifelong prevention - Hub3- Fondazione anthem - advanced technologies for human-centred medicine - Hub7 - fit for medical robotics società consortile a responsabilità limitata 	II/2023 Apertura della seconda finestra del primo bando e ricezione delle proposte progettuali per la seconda finestra del primo bando.

